

災後重建紀錄

蓄勢待發，全力備戰

紀錄日期: 03/15/2021 ~ 03/19/2021



受損建築物之安全鑑定於本週展開取樣作業，鑑定流程需符合「財團法人全國認證公司基金會(TAF)」認證合格之機構執行作業，主要檢測項目為混凝土強度檢測、氯離子強度檢測、混凝土中性化深度檢測、垂直測量及燒失量等，由技師執行建築物現況記錄、經緯儀觀測法量測傾斜率及鑽心試體取樣，並拍照以供存查。取樣之樣品需委由 TAF 認證實驗室執行檢驗，建築師依據國家標準 CNS1238 及 CNS3090 等基準

規範，進行調查研判，提出結構強度、耐久性及修復補強方式等安全評估後，出具安全鑑定報告書，其作業時程需約二個月，祈求可透過修復補強方式復原建築物，靜候鑑定佳音。

承租正峰廠房支應之移地生產，預計生產 5 項中間體，為因應產品屬性的多樣性製程需求，故需執行製程設備之細部修改，主要分為蒸餾生產設備之建置作業及管件管路之優化作業。



蒸餾生產設備之建置作業，預計架設二座蒸餾生產設備，目前蒸餾生產主設備仍在建置中，因增列之第二座蒸餾生產設備，仍需新購一台再沸器，承包商趕工生產製作中。因考量同時

啟用兩條蒸餾產線，其冷卻系統將有效能不足之疑慮，經評估可由清洗冷卻系統之週邊設備，如冷凝器、冷卻水塔及冰水機等，增加其冷卻效率，故委由工程同仁與承包商共同執行清洗作業，於本週已完成此作業，完成清洗之冷凝器於本週亦完成架高定位作業。目前主設備陸續定位中，待配管作業及管路細部修改完備後，將先啟用一條蒸餾產線，以因應生產需求。

目前管件管路之優化作業逐漸收尾，預計先啟用一條生產線執行生產，為確保優化作業無虞，執行生產前，生產同仁將逐一執行製程設備功能之測試運轉，入水於製程設備執行試漏試壓及測試加熱、冷卻與傳輸等系統，確認設備間的連結運轉與操控可符合設計需求。以嚴謹的態度，積極執行製程設備試運轉測試，確實掌握並及早處理潛在問題，確保製程可依循規劃的工序進行生產。


災後重建紀錄



待製程設備試運轉測試及原物料檢驗確認無虞後，將於租借廠房正式展開生產作業，預計生產中間體品項為 Pyrogallolaldehyde，由旭富同仁負責生產製造及製程檢驗，最終成品將運回旭富執行成品檢驗及倉儲作業，為確保移地生產之製程品質，同步執行製程確效、清潔確效及安定性試驗，一切生產流程皆遵循旭富品質系統規範執行。



Pyrogallolaldehyde 執行生產前，由單位主管負責統籌生產製程準備事項，如生產前人員教育訓練、製程週邊設備配件之查檢及人力調配等事宜。

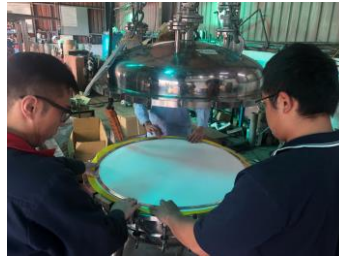

因移地生產之製程設備及動力源設施的操作模式，與廠內生產設備有所差異，考量人員執行生產製程運作的流暢度，故單位主管多次實地場勘租借廠房，規劃製程動線、人流物流及生產前準備事項，時刻思考突發狀況之應變措施，並召開生產前試車及風險評估會議，與生產同仁及相關部門同仁說明產品屬性、生產流程及設備操作等作業注意事項，並再三叮囑所有作業需以人員作業安全為第一考量。



製程週邊設備配件亦同步進行查檢及製管備料，由生產同仁查檢製程週邊設備狀態，在清潔及拆裝過程中，逐步確認設備零件與耗材可用性及汰換更新，確實執行試漏試壓以確保設備性能可正常運作，並由工務同仁依製程需求製作特規客製化配件及傳輸管等，以供生產，即時備援。

委託生產支應之永光化學，於 3 月 18 日已正式簽訂契約，委託生產品項為客戶臨床試驗所需之癌症原料藥，委託期間為於 3 月 18 日至 8 月 31 日，公司仍持有其製程技術及智慧財產權，為因應客戶臨床試驗需求，故委託永光協助生產，生產流程為依循其品質系統規範執行，初期由廠內派員協助指導生產，後續生產將交由永光負責，公司希望盡最大能力，滿足客戶新藥開發之臨床試驗需求。

災後重建紀錄

我們是一艘航行於大海中的船艦，在這艘船上，每一個人都發揮著重要的作用，猶如無數的絲線擰在一起的船舶纜繩，各司其職，各盡其分，彼此間相互協調合作，患難與共，凝聚眾人力量，帶動萬噸巨輪航行。如同美國學術教育之父 Noah Webster 所言：「人們在一起可以做出單獨一個人所不能做出的事業；智慧、雙手、力量結合在一起，幾乎是萬能的。」

汲取昨日的經驗和教訓，每個細節與時刻均不容緩，在風雨中穩舵破浪，雙手握緊船舵，拉緊繩索，以昂揚的鬥志迎接明日嶄新的挑戰，乘風啟航的時日即將到來！
