

# 災後重建紀錄

## 1.01 的勤勉法則

紀錄日期: 04/19/2021 ~ 04/23/2021




第一階段的廠區拆除計畫，執行拆除廠區為非建築物安全鑑定區域之 03/05/06/07/08/10 生產區，其廢棄物處置相關計畫書已由清運廠家呈報桃園市政府環保局，預計下週將開始執行拆除作業。

公司代表會同清運廠家代表及作業人員召開施工前會議及環安衛教育訓練，實地場勘說明拆除作業範疇、重型機具動線安排、特殊作業注意事項、廢棄物分類處理及保險理賠規範等

相關事宜，一切作業需遵循勞工安全衛生法規及廠內安全衛生規章執行，再三叮囑人員安全務必為作業首要考量。

目前廠區正陸續執行清運前置作業，因考量拆除動線及運作效率與拆卸廢棄物儲存空間，故由清運廠家先將日前拆卸之有價廢棄物執行清運作業，其相關資料皆有留存以備查證，並同步將祝融毀損之熱煤油鍋爐及蒸汽鍋爐等相關大型週邊設備移出鍋爐房，以利下週拆除作業運作，加快第一條生產線之廠區重建時程。

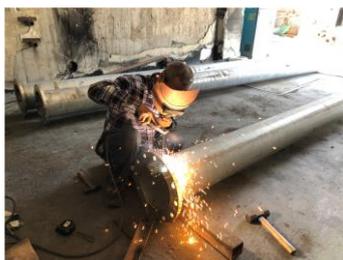

因祝融毀損之廠區公共設施的第一管架區於日前已完成建置作業，管路架設作業規劃以階段性執行，先建置主幹管系統，再依製程設備設施及廠區空間執行分歧管之細部管路連結作

業，首要規劃為供給研發實驗室、試驗工廠及 03B/05 生產區之動力源，如蒸汽、氮氣及冷卻水等生產能源。

本週開始執行第一階段管路架設作業，供給區域為研發實驗室及試驗工廠，承包商現正加緊趕製主幹管之焊接法蘭等管路預置作業中。因 05 生產區尚未建置完成，故其規劃為第二階段管路架設作業，預計將於 03B/05 生產區復歸前建置到位，以供生產所需。

## 災後重建紀錄



在祝融事件前落成之研發大樓，僅外觀及內部設施輕微受損，所幸無損及建築結構，故管理階層決議公司研發動能絕不停歇，持續推動新藥研究計畫，故由研發及工程部門主管著手規劃研發大樓修復作業及研發設備設施建置作業。



由承包商及廠內同仁們目不交睫共同努力下，目前大樓修復作業之外觀重整、內部設施之局部重建及環境清理，確依規劃期程持續進行中。研發設備設施之試驗工廠的製程設備及公共設施，其建置作業已陸續安裝到位，公共設施之管路配管及電力管線等架設作業如火如荼執行中。研發大樓之建置時程，預計將可於今年第四季前完工啟用。



在瓦礫堆中佈滿荊棘的路程，每一步舉步維艱，每一步戒慎恐懼，不管步伐多小，不論腳步多慢，我們仍不斷朝著目標匍匐前進。曾如日本樂天社長三木谷浩史所說：「1.01 的 365 次方等於多少？答案是 37.78」每天進步 1%，一年後將強大 37 倍！

暫時停下腳步的時日，我們持續調整公司組織之管理運作，完善過往不足之處，而停滯形成的差距，將轉化為前進的動力，銘記過去，著眼未來！
