


災後重建雙週報

紀錄日期: 11/29/2021 ~ 12/10/2021

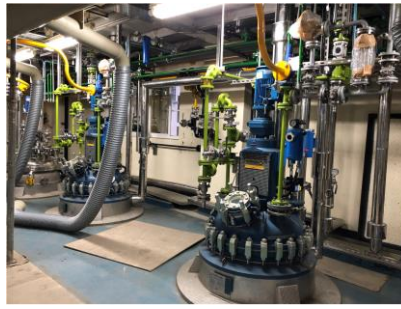

A 廠區規劃第一階段復產之 03B/05 製程區與 02/08 乾燥區，其進度為 03B 製程區相關之生產反應的製程設備與潔淨室的空調系統已完成設備與圖控確效作業，預計於年底前投產；05 製程區的鋼構平台主體大致建置完成，其新購訂製的數顆氫化反應槽已完成製作，現正執行出廠前之高壓容器安全檢查作業，預計年底前可進廠定位，其製程配管已開始著手執行前置作業，規劃於明年初盡快投產。02/08 乾燥區之潔淨室之控制系統規劃已與廠商達成作業共識，其室內主體大致建置完成，新購空調箱已定位安裝並依續完成送風系統建置，環境感測器裝設逐步執行，其電力拉線工程已安排施作中，待硬體設備建置完備後，立馬安排軟體系統作業連線控制測試。

另一復產重點之研發試驗工廠，如上圖所示，其備有數種不同特性之小型反應槽、離心機與乾燥機等，且內部設計建置專用之小型公設動力源，可執行製程放大工序。目前已完成反應槽之製程設備設施的建置定位及與公共設施的配管作業，其圖控系統目前持續與工程師討論，待達成共識後，將著手安排電腦控制連線作業。且其潔淨室與空調系統於日前已發包建置中，預計於明年第一季完成，待離心機與乾燥機及附屬設備定位配管後，並完成相關確效作業，將可安排小量投產，以供放大生產前小量試製。



因火害重損之 B 廠區，其現況如上圖所示，原產線為公司主力產品與委託代工品製造區，為公司生產重地之一，其建築物安全鑑定已由建築師公會判定為可修復補強建築結構，無需拆除。為加快 B 廠區之復產時程，管理階層於本週發包營建公司執行土木修復工程，預計明年 7 月中旬修復完成。修復工程主要為保留原有結構斷面與配置，補強鋼筋混凝土牆體達到足夠的耐震需求及建置鋼構平台等。其相關之前置作業，如：毀損製程設備設施及管路管線已完成拆除卸管作業，需新購之設備亦大致完成採購訂製作業，待 B 廠區建物修復完成後，將安排製程設備進廠定位配管。

目前 A 廠區由同仁們與工班師傅們，日復一日不停地趕工建置中，擴增產能之觀音 2 廠的營建工程現正執行建置地基的基礎工程。走過了伸手不見五指的時日，眼前的路相對明朗光亮，廠房修建只是旭富復產的基礎作業之一，製程廠區及新購建置之設備皆須完成確效作業與各國客戶稽查，持續建立及鞏固客戶關係，更是我們未來的營運重點要項，我們會持續努力，關關難過關關過！
