


災後重建雙週報

紀錄日期: 01/10/2022 ~ 01/21/2022

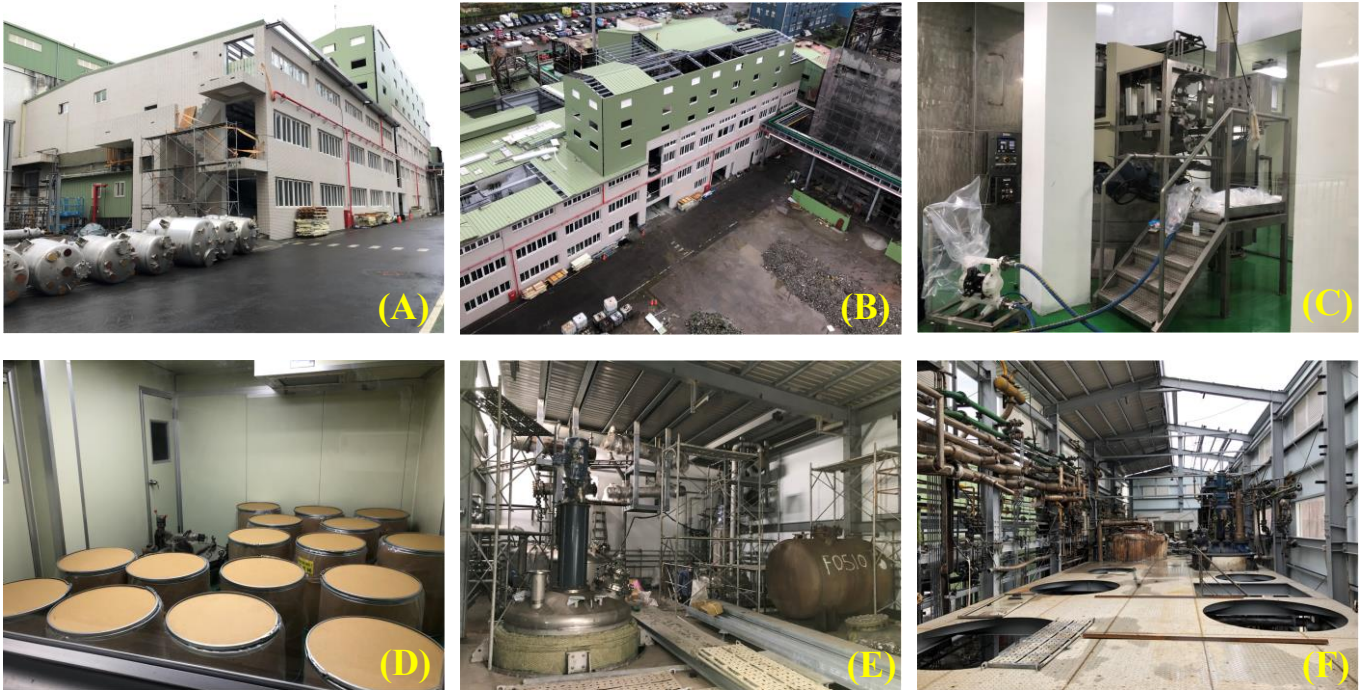

A 廠區的第一階段復產逐步完備(A 廠區外觀修建現況請見圖 A 及圖 B)，已完成第一條生產線之復工，由 03B 製程區合成反應至 02 區(圖 C)/08 區(圖 D)乾燥研磨，目前已完成數批之抗憂鬱及降血脂等藥物生產，且由品管檢驗驗證成品品質符合廠內規範，同時亦佐證製程設備設施之生產效能無虞，並與客戶達成供貨協商共識，將陸續安排其他品項至生產排程中，確保客需供貨量，穩定公司營運基礎。

第二條生產線復產預計將於今年第二季前期加入生產排程，其關鍵之 05 區(圖 E)/16 區之修建工程仍持續執行中後期的製程配管及設備設施保冷保溫施作；15 區之鋼構平台於近期已大致完成建置(圖 F)，其所需之潔淨室將進行新建，以確保產出成品無污染疑慮，目前其空調箱已完成定位，待送風系統及室內主體建置完備後，再行試車調整效能；06 區原有數座蒸餾系統，考量設備現況及新購附屬設備交貨期，將先修復一座以供客戶需求，其製程配管已安排工班趕工施作，而控制系統及相關程式需求已與包商協議架設配線作業，待其設備設施與相關文件完備後，將可加入投產行列，提升經營績效。

2021-2022 年是旭富復工最嚴苛的期間，以正念沉著面對所有險峻的時刻，以隨機應變處理所有驟變的事務，這片家園的一磚一瓦，是我們胼手胝足辛苦重建起來的，終於能迎接復甦的契機到來，在此萬分感謝同仁們的辛勞付出，我們才能一步一步地向前邁進，新的一年就要到來，先在這兒向大家拜早年，虎轉乾坤行大運，虎躍新程兆豐年！
