災後重建雙週報　　紀錄日期: 12/13/2021 ~ 12/24/2021

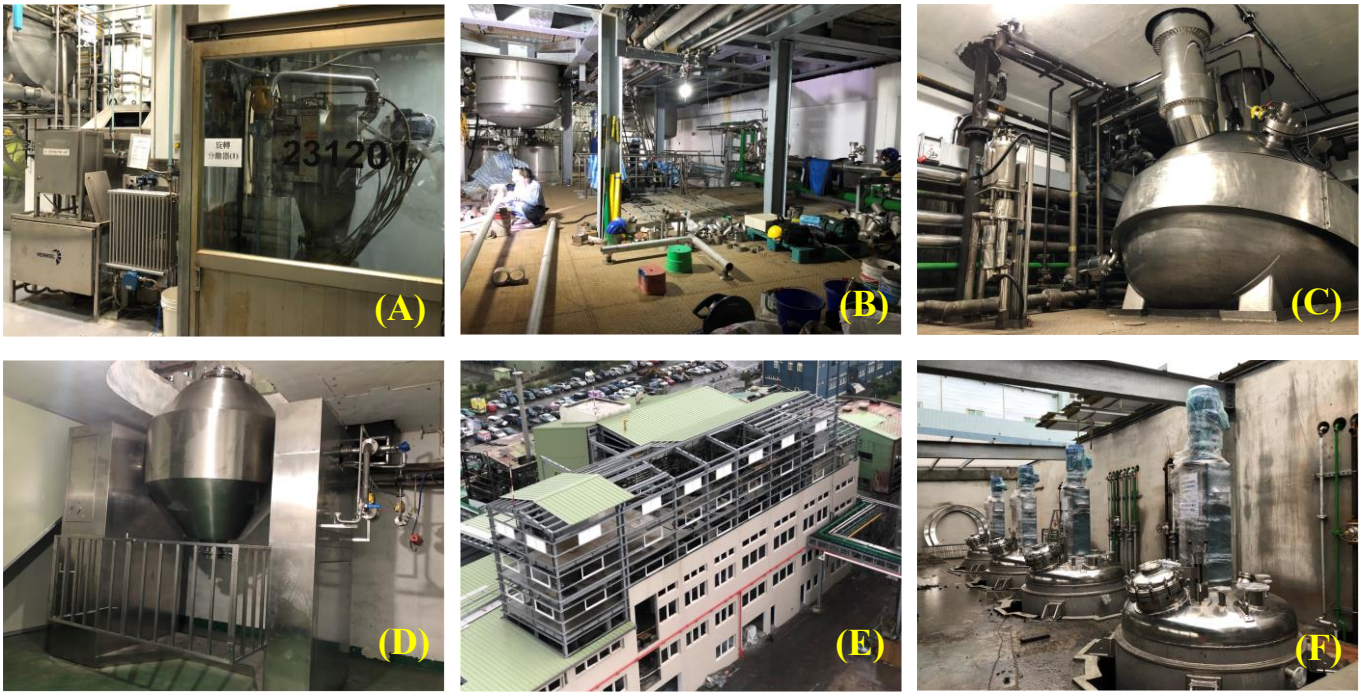

03B 製程區之製程設備設施與空調系統於日前已完成設備驗證作業，輕微受損之離心機的設備驗證與原廠技師們執行跨國連線亦於本週完成作業(圖 A)，03B 製程區修復工程已完工，並由生產同仁負責例行性清潔檢點維護作業，確保生產設備的效能無虞。05 製程區新購的氫化反應槽之出廠前高壓容器安全檢查陸續完成並安排進廠定位作業，其相關製程附屬設備逐步安裝及製管未停歇持續趕工施作中(圖 B)。

08 乾燥區之二台乾燥機 (圖 C、D)，目前正在趕工中，期能先行啟動其中一台，以搭配 03B 製程區之產出; 另其二套空調系統之潔淨室的環境感測器裝設皆步入收尾作業，也是預計先啟用一套空調系統以供生產排程，目前已執行送風系統與控制系統連線的效能測試，確認模組參數後，將立即架設另一套空調系統，加快完成 08 乾燥全區復歸。15/16 製程區亦如火如荼執行修復工程中(圖 E、F)。

倏忽之間公司災變已屆一年，由一開始的錯愕不已至共同攜手堅強面對，同仁們群策群力，胼手胝足逐步完成每一項賦予的任務，奉獻一己之力不僅是為了讓公司重啟生產，更是要讓移地生產的同仁們早日賦歸。隨著 A 廠區第一階段復產區及公共設施設的修復工程漸次到位，終於迎來災變後的第一次現場生產，於 03B 製程區執行產品再結離心，產前同仁們反覆審視每一生產環節的前置作業，確保製程設備設施的效能運行及與控制系統連線無虞，並依循生產程序規範，兢兢業業地順利完成第一批生產作業，這一枚強心針的注入，讓我們更有信心繼續努力，We can do it，keep it up!
